
GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE - AULA 07/05

EXERCÍCIO 1 – PROJETO P3

- Incluir o projeto usando o calendário GPS e data de início = 10/05/2021
- As atividades com suas durações e dependências estão especificadas na tabela a seguir

Atividade	Duração	Precedência
Α	5 dias	-
В	10 dias	Α
С	7 dias	В
D	10 dias	Α
E	3 dias	Α
F	12 dias	E
G	10 dias	C;D;F
Н	5	G

 Estruturar o cronograma de acordo com a EAP abaixo, incluindo um marco ao final de cada fase

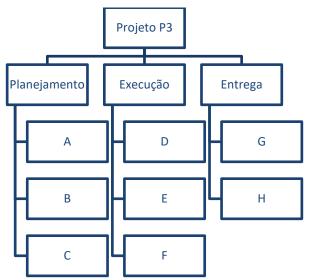

Responda as seguintes questões:

a) Data de término do projeto:	
--------------------------------	--

b) Atividades que fazem parte do caminho crítico: ___

c) Durações

Fase	Duração em dias
Planejamento	
Execução	
Entrega	
Total do projeto	

EXERCÍCIO 2 - Exemplo de projeto de desenvolvimento de software com Alocação de Recursos

- 1. Elaborar cronograma do projeto considerando: Data de início: 01/06/2021
- 2. Usar o calendário GPS
- 3. Relacionar as atividades e inserir um Marco em cada ponto que achar conveniente para controle do seu projeto. Acrescentar quantos Marcos achar necessário:

	Nome da tarefa	Predecessoras
1	Desenvolvimento do Sistema GPS	
2	Concepção	
3	Definição do Escopo e Objetivos	
4	Estudo de Viabilidade	3
5	Planejamento do Projeto	4
6	Elaboração	
7	Levantamento das necessidades	5
8	Levantamento dos processos	7
9	Elaborar modelo de dados	8
10	Especificação Funcional	8
11	Especificar Interfaces	9;10
12	Construção	
13	Desenvolvimento	11
14	Planejamento dos testes	11
15	Planejamento da implantação	11
16	Testes	14
17	Documentação	11
18	Transição	
19	Treinamento	13; 17
20	Implantação	19;15;16

4. Relação de Recursos do Projeto

Recurso	Quantidade	Custo hora	Custo hora	Custo de	Apropriação
		normal	extra	uso	de custo
Gerente de Projeto	1	50,00	80,00		Rateado
Analista	1	30,00	50,00		Rateado
Documentador	1	20,00	30,00		Rateado
Testador	2	10,00	15,00		Rateado
Programador	4	10,00	15,00		Rateado
DBA	1	50,00	50,00	200,00	Rateado
Papel		20,00			No fim

4. Alocação de Recursos (Alocar o máximo dos recursos disponíveis)

10
16 hrs
16 hrs
8 hrs
12 hrs
4 hrs
8 hrs
4 hrs
24 hrs
8 hrs
4 hrs
40 hrs
12 hrs
4 hrs
8 hrs
8 hrs
8 hrs
20 hrs
16 hrs
40 hrs
16 hrs
16 hrs
16 hrs
40 hrs
40 hrs
4 hrs
16 hrs
8 hrs
O III S
8 hrs
O III S
40 hrs
10 1113
00 hrs
5 pct
J pci
2 hrs
8 hrs
40 hrs
+U IIIS
1 6
4 hrs
40 hrs 30 hrs
40

Ourações e custos			
Fase		Duração em dias	Custos em R\$
Concepção			
Elaboração			
Execução			
Finalização			
Custo e trabalho ou consumo t	otal de recursos		
Recurso		lho ou Unidades	Custos em R\$
Gerente de Projeto			
Analista			
Documentador			
Testador			
Programador			
DBA			
Papel			
